A图规范

页面负责人王丰

修订版本	描述	日期	作者
v1.2	补充需求A图详细说明。	2026-9-18	王丰
v1.1	调整A图示例。	2025-4-18	王丰
v1.0	完成初版规范。	2025-1-18	王丰


- 1. A图模板
- 2. 需求A图示例
  - 2.1 竖线（关键节点）
  - 2.2 框（任务）
- 3. 项目A图示例

本规范涉及的A图可在A图示例 - 王丰 - Confluence中编辑或复制。

1. A图模板

区域	说明
图例区	一般无需修改。
时间节点区	时间节点可填写日期或版本号。 阶段目标可选。 关键的时间节点和分隔线可使用不同的颜色。
责任区	责任人/组可填个人、项目组、模块组等。 **责任人右侧的任务属于该责任人，责任人和任务之间不需要连线。** 对于较大的A图，可在责任人/组之间增加分隔线。

任务区	**正确拆解任务依赖关系是画好A图的关键：** • **一般由最终目标出发，逐级向前拆解；** • **任务依赖关系和实际执行人员无关；** • **没有依赖关系的任务之间不连线；** • **拆解后可从图中看出项目执行的关键路径，合理规划人力。** 使用圆角曲线，在依赖关系交叉时更加清晰。  工作量可选，单位为人日。 执行人可选。 根据任务起止时间决定格子宽度。 根据任务进度决定颜色。

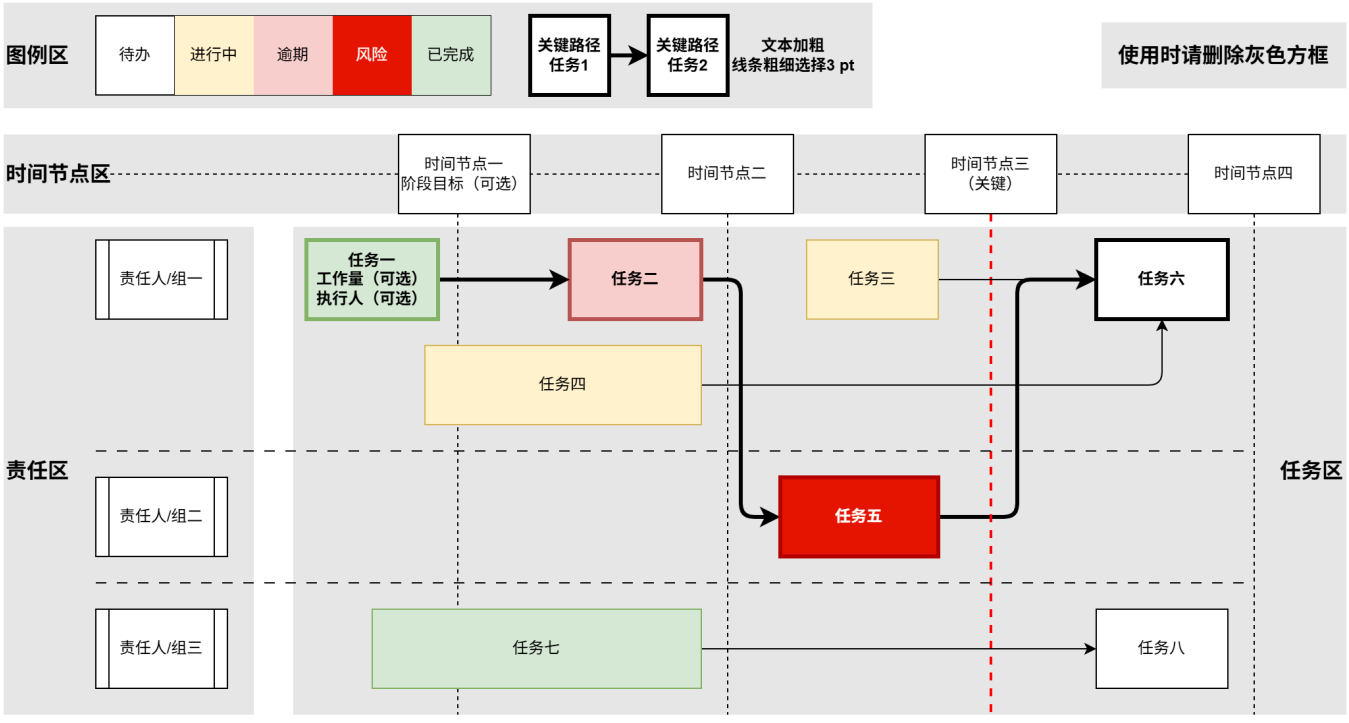

2. 需求A图示例

2.1 竖线（关键节点）

需求节点（需求澄清、开发方案评审、开发自测等）画一条竖线。

每周日画一条竖线。

（可选）其它关键节点（例：重点功能开发完成）画一条竖线。

2.2 框（任务）

每个框包含任务概要、经办人、初始预估三项信息。

概要清晰明了，可验收：

- 不出现开发1/3、开发2/3、开发3/3等模糊的表述；
- 不写目标，如测试完成、代码合入。

经办人只能有一位。

初始预估一般不超过3日：

- 不明确的任务初始预估可以大一些；
- 至少需明确一周内任务。

按照图例（加粗）标出关键路径框。

按照图例（标红）标出高风险框：高风险需求至少有一个高风险任务。

3. 项目A图示例

项目A图中一个任务点的工作量一般为数周或数月，越早的任务拆解越细。
